




ارسال أحدث قوائم مقدمي
الخدمات المعتمدة من
NREA
تبعاً لحجم المحطة
بواسطة ENPC ورقمها على
System

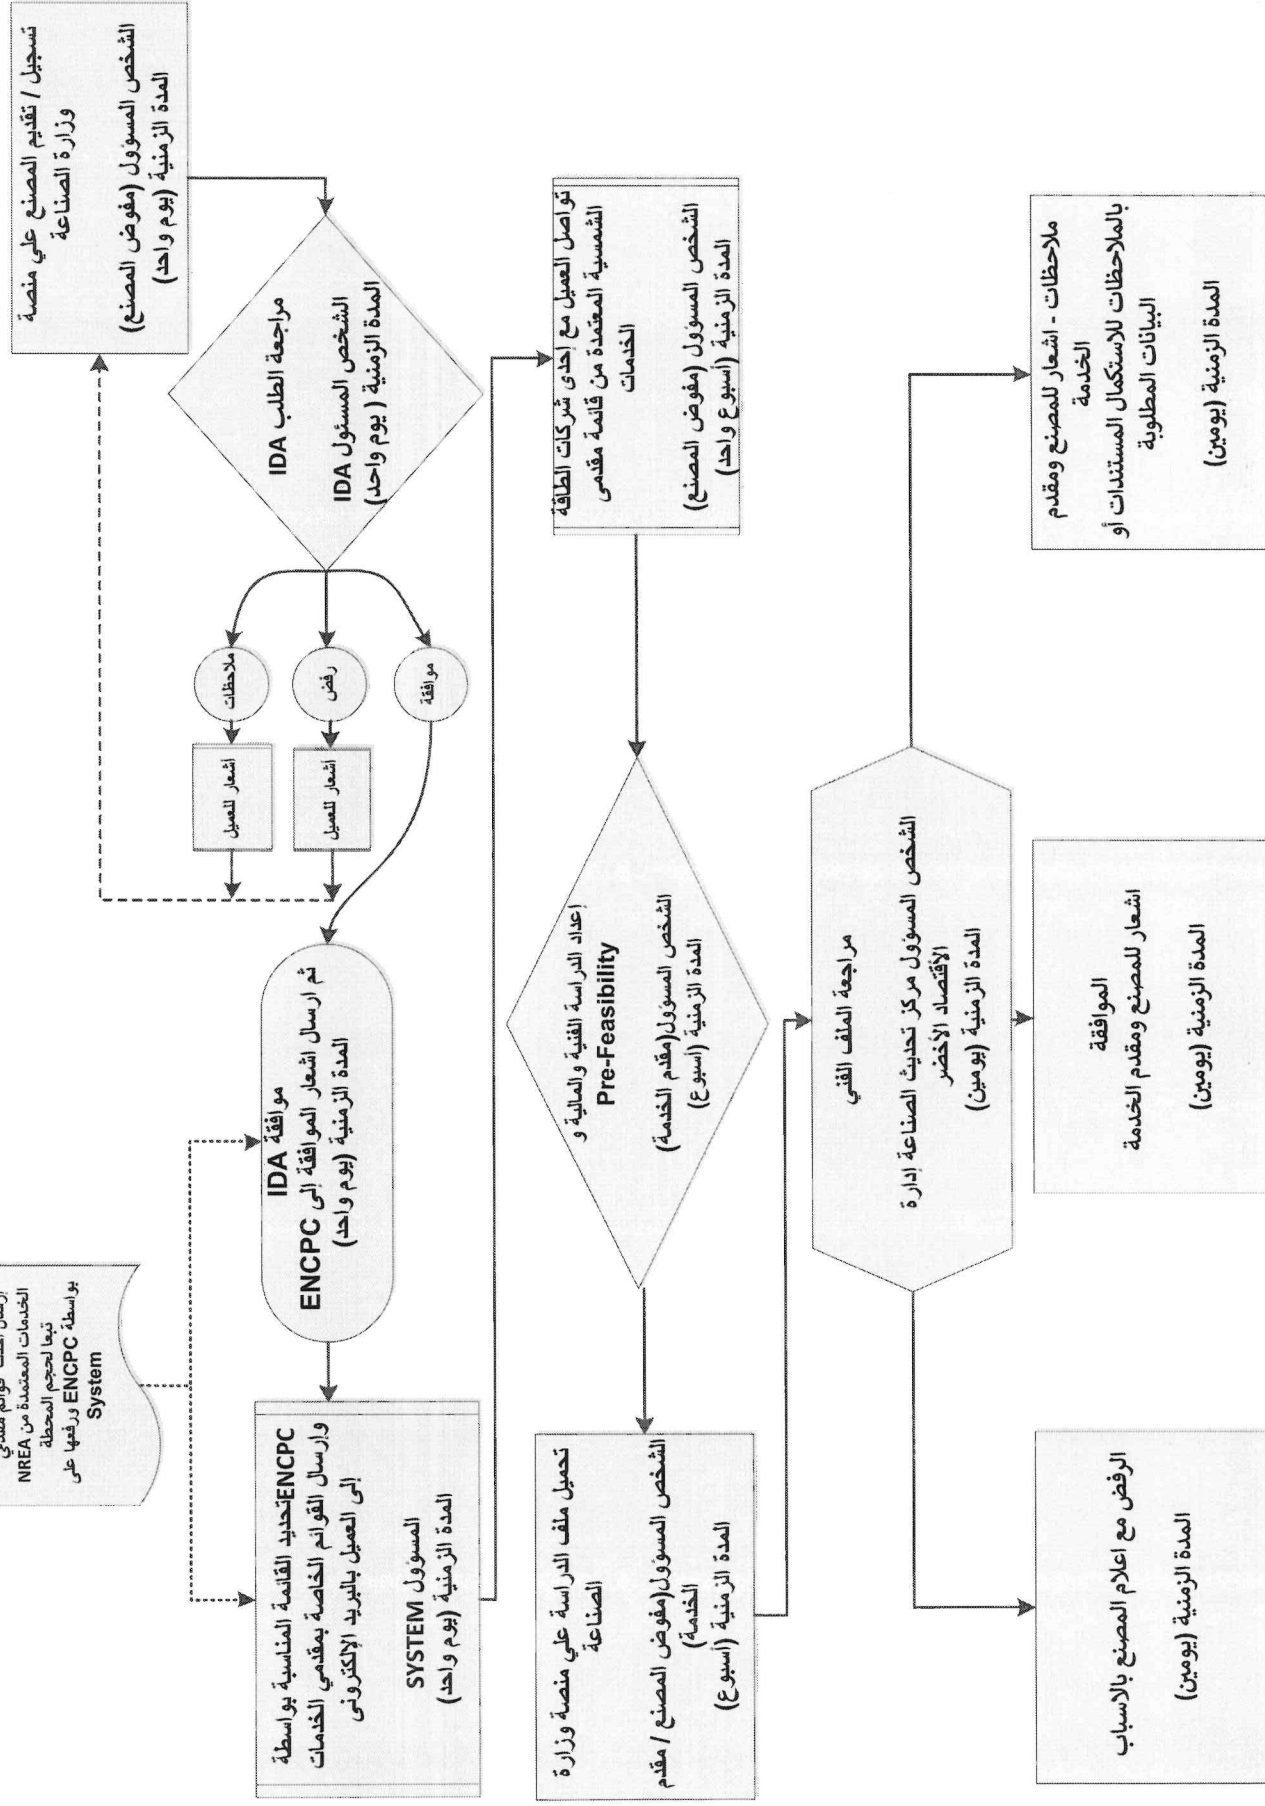


المرحلة الثانية الأعتقاد والتمويل

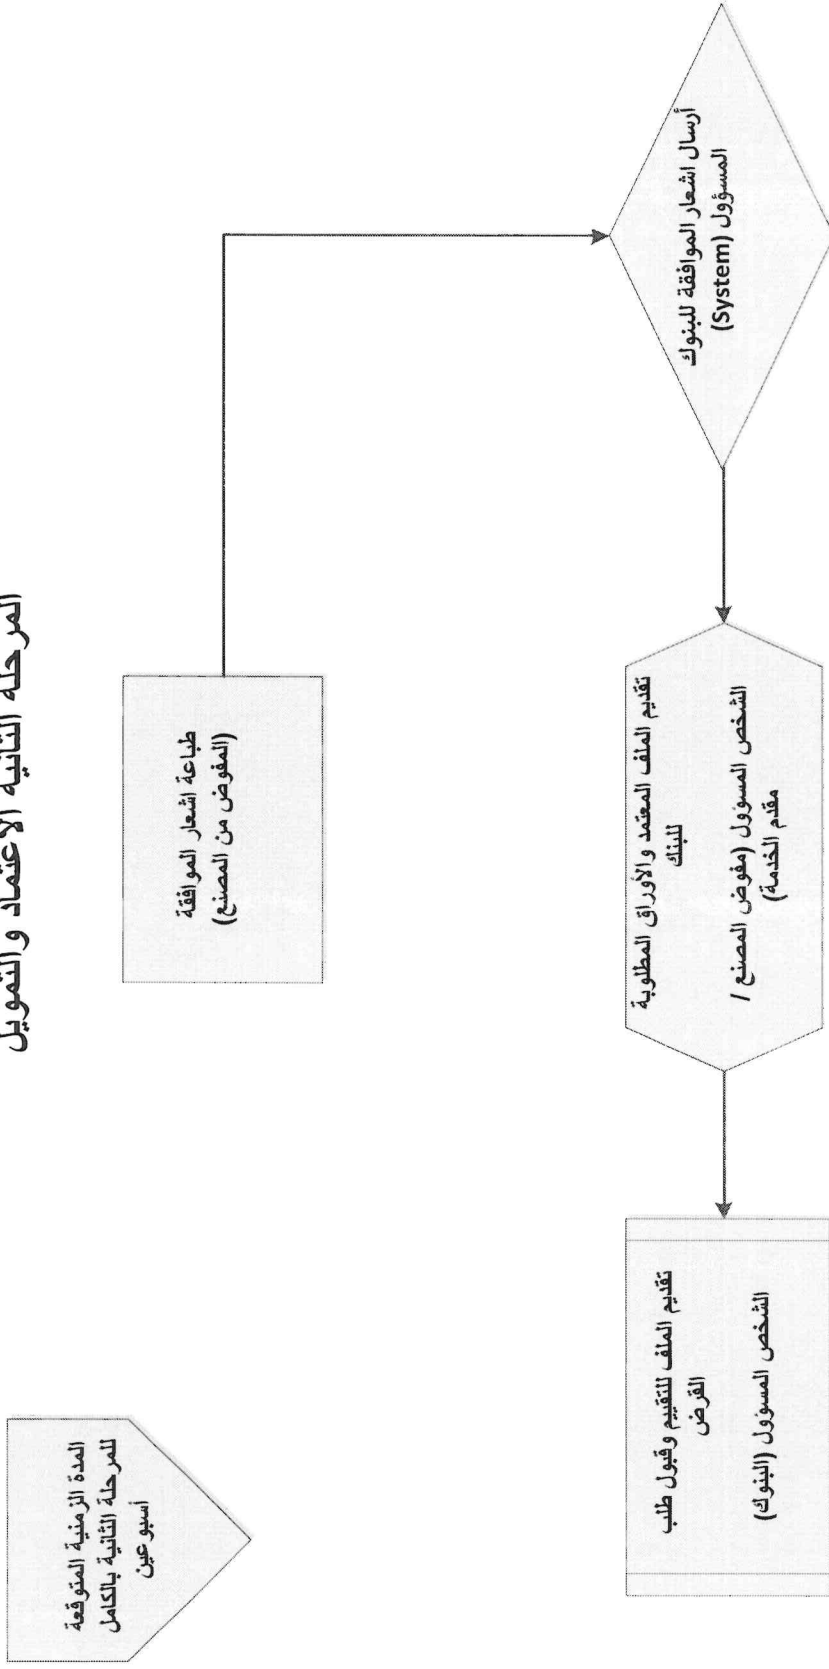

المرحلة الثالثة التعاقد والتركيب

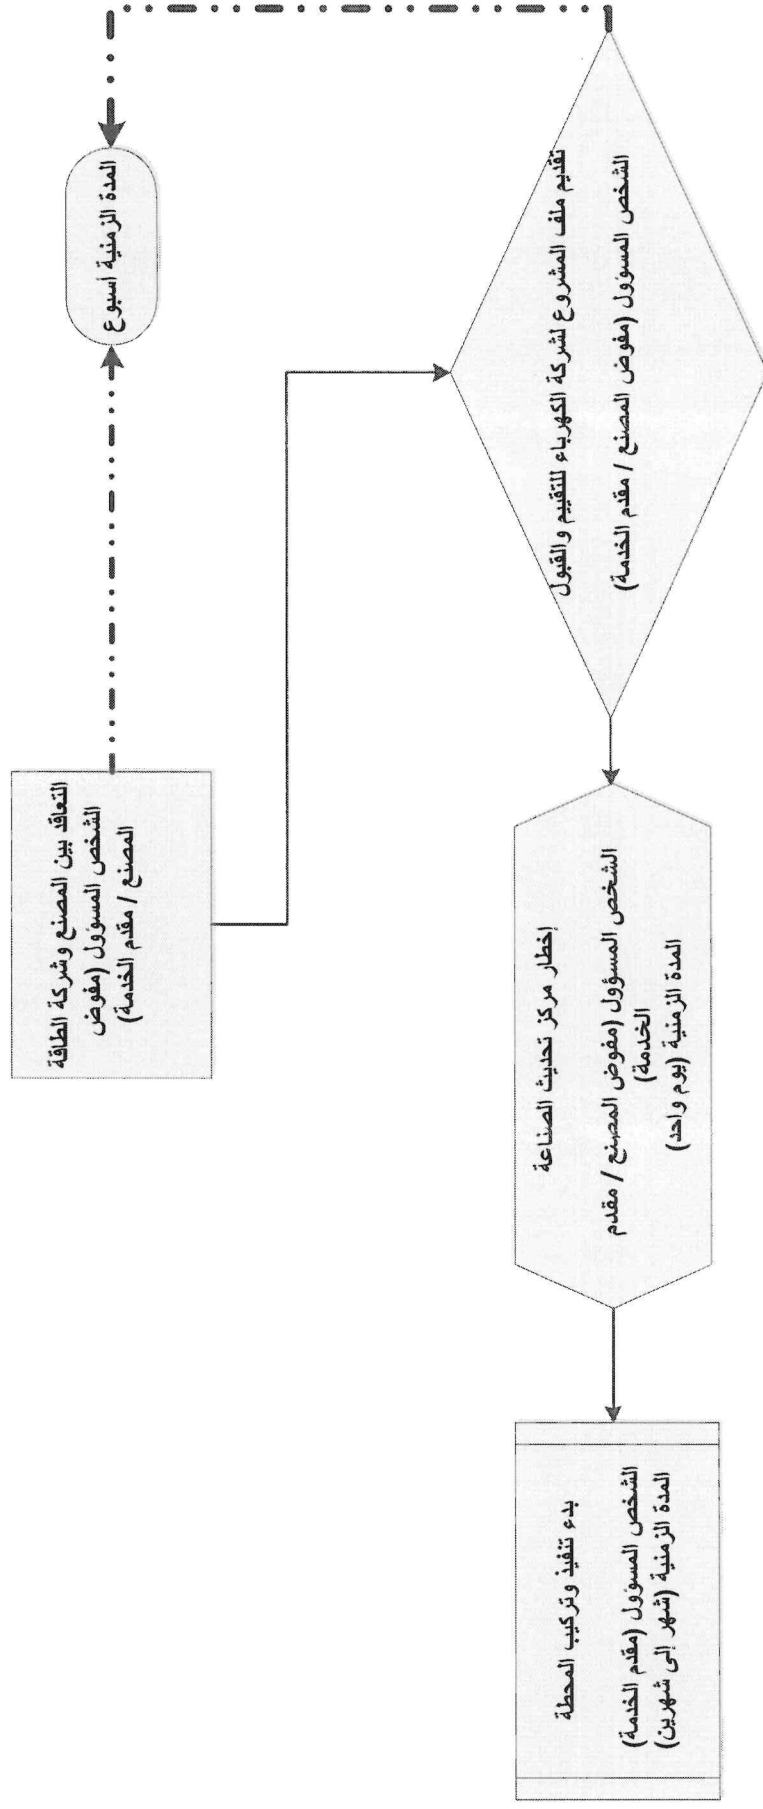

المرحلة الرابعة التنفيذ والربط والتشغيل

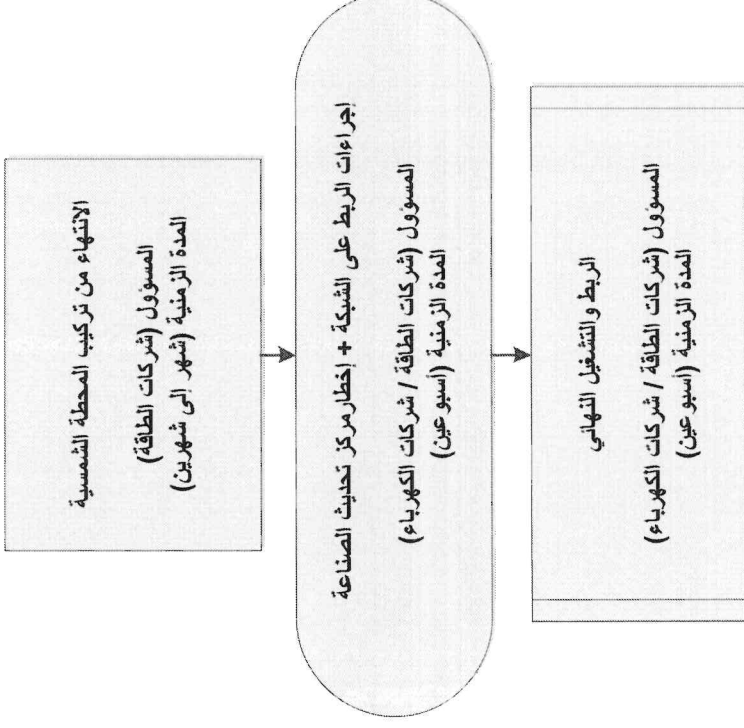

الملخص الزمني:

المرحلة المدة التقديرية المرحلة الأولى تقدم المصنع والدراسة لمدة أربعة أسابيع تقريبا المرحلة الثانية المراجعة والاعتماد والتمويل لمدة أسبوعين تقريبا المرحلة الثالثة والتعاقد والتركيب لمدة من خمسة إلى تسعة أسابيع تقريبا المرحلة الرابعة التنفيذ والربط والتشغيل لمدة من ثمان إلى اثني عشر أسبوعا تقريبا.

نقاط تنظيمية مقترحة:

1. إصدار دليل إجراءات موحد يوضح الـ Criteria، المستندات المطلوبة، خطوات التقديم، ومسؤوليات كل جهة.
2. إنشاء نافذة متابعة موحدة (Shop Stop-One) أو منصة إلكترونية لتتبع حالة كل مشروع بين وزارة الصناعة والبنك - مقدمي الخدمات - وزارة الكهرباء.
3. إلزام مقدم الخدمة بإخطار IMC عند تقديم المشروع لشركة الكهرباء وعند الربط النهائي، لضمان مطابقة التنفيذ للمشروع المعتمد.
4. المشاركة في تحديث قائمة مقدمي الخدمة المعتمدين بصورة دورية وربط الاستمرار في القائمة بالأداء والالتزام وجودة التنفيذ.
5. إعطاء أولوية في المرحلة الأولى للمصانع ذات الاحتمال النهائية المرتفعة لتحقيق أعلى وفر ممكن في استهلاك الكهرباء.

مقترح الخطة التنفيذية لمبادرة "شمس الصناعة"

المخرج	النماذج / الإجراء المطلوب	المدة التقديرية	المسؤول/المنسق	الجهة المسؤولة	المهمة	المرحلة	
رقم تسجيل للمصنع غير مكرر	تسجيل أونلاين سجل تجاري - رخصة تشغيل / سجل صناعي	1 يوم	الشخص المفوض	المصنع	تسجيل / طلب المصنع على منصة وزارة الصناعة	المرحلة الأولى تقديم المصنع والدراسة	
أشعار موافقة	الموافقة - ارسال اشعار للمصنع ➡	1 يوم	مسئول IDA "مراجعة المستندات"	IDA	مراجعة الطلب		
أشعار ملاحظات	وجود ملاحظات - ارسال اشعار للمصنع ➡ بالملاحظات للاستكمال						
أشعار الرفض واسبابه	الرفض - ارسال اشعار بالرفض ➡						
اختيار قائمة مقدمي الخدمات المتوافقة مع حجم العميل	اشعار الموافقة من IDA	1 يوم	مسئول ENCPC	ENCPC	ارسال اشعار الى ENCPC بالموافقة من IDA		
بريد الكتروني من System للعميل	ارسال بريد الكتروني للعميل يحتوي على قائمة بمقدمي الخدمات				System		ارسال احدي القوائم الخاصة بمقدمي الخدمات حسب حجم العميل
اختيار مقدم الخدمة					الشخص المفوض		المصنع
دراسة تشمل القدرة، الوفرة، التكلفة والمدة		1 أسبوع	SP	شركة الطاقة الشمسية	إعداد الدراسة الفنية Pre-Feasibility		
					المصنع + شركة الطاقة		تحميل الملف إلى وزارة الصناعة على svsystem
اشعار ل IMC	أشعار بالبريد الالكتروني ل IMC						

اشعار موافقة*	الموافقة - اشعار للمصنع ومقدم الخدمة	يوم 2	إدارة الاقتصاد الأخضر IMC	IMC	مراجعة الملف الفني	المرحلة الثانية والاعتماد والتمويل
←	اشعار موافقة*	أسبوع 2	الشخص المفوض	العمل	طباعة اشعار الموافقة	المرحلة الثانية والاعتماد والتمويل
←	اشعار ملاحظات*		System	System	أرسال اشعار الموافقة للبنوك	
←	اشعار الرفض* واسبابه		الشخص المفوض SP /	المصنع + شركة الطاقة	تقديم الملف المعتمد والأوراق المطلوبة للبنك	
			البنك وفق التعليمات	البنك	تقديم الملف للتقييم وقبول طلب القرض	
عقد تنفيذ		اسبوع 1	—	المصنع + شركة الطاقة	التعاقد بين المصنع وشركة الطاقة	المرحلة الثالثة التعاقد - التركيب
موافقة شركة الكهرباء			SP	المصنع + شركة الطاقة	تقديم ملف المشروع لشركة الكهرباء للتقييم والقبول	
أشعار إخطار ل IMC علي System			الشخص المفوض SP /	المصنع + شركة الطاقة	إخطار IMC	
محطة منفذة			SP	شركة الطاقة	بدء تنفيذ وتركيب المحطة	
استكمال متطلبات الربط + إخطار IMC		أسبوع 2	المتابعة IMC	شركة الطاقة + شركة الكهرباء	تنفيذ إجراءات الربط على الشبكة + إخطار IMC	المرحلة الرابعة التشغيل والربط
تشغيل المحطة وربطها بالشبكة		أسبوع 2-1	—	شركة الكهرباء + شركة الطاقة	الربط والتشغيل النهائي	

* قوائم مقدي (القوائم المعتمدة من هيئة الطاقة الجديدة والمتجددة - والتي تقسم تبعاً لحجم المحطة الشمسية)
 * نموذج الطلب (نموذج يتم تصميمه يعطي صورة كاملة للمصنع أدارياً وفنياً)
 * تعتمد مدة التنفيذ على القدرة وحجم المشروع.

المرحلة	المدة التقديرية
المرحلة الأولى تقدم المصنع والدراسة	2 إسبوع تقريباً
المرحلة الثانية المراجعة والاعتماد والتمويل	2 إسبوع تقريباً
المرحلة الثالثة والتعاقد والتركيب	5 - 9 أسابيع تقريباً
المرحلة الرابعة التشغيل والربط	4 أسابيع تقريباً
إجمالي المدة من تقديم المصنع حتى التشغيل	نحو 13 - 17 أسبوع

نقاط تنظيمية مقترحة

1. إصدار دليل إجراءات موحد يوضح Criterial ، المستندات المطلوبة، خطوات التقديم، ومسؤوليات كل جهة .
2. إنشاء نافذة متابعة موحدة (One-Stop Shop) أو منصة إلكترونية لتتبع حالة كل مشروع بين وزارة الصناعة والبنك-مقدمي الخدمات-وزارة الكهرباء
3. إلزام مقدم الخدمة بإخطار IMC عند تقديم المشروع لشركة الكهرباء وعند الربط النهائي، لضمان مطابقة التنفيذ للمشروع المعتمد .
4. المشاركة في تحديث قائمة مقدمي الخدمة المعتمدين بصورة دورية وربط الاستمرار في القائمة بالأداء والالتزام وجودة التنفيذ .
5. إعطاء أولوية في المرحلة الأولى للمصانع ذات الأحمال النهائية المرتفعة لتحقيق أعلى وفر ممكن في استهلاك الكهرباء.

بيانات عامة

اسم الشركة				
المحافظة				
العنوان				
تليفون (1)				
تليفون (2)				
موقع الكتروني				
مسئول الاتصال				
الإسم				
الوظيفة				
تليفون- فاكس - موبايل				
البريد الالكتروني				
القطاع				
المنتجات الرئيسية				
العمليات الرئيسية للتصنيع				
عدد العمالة				
الإستهلاك السنوي من الكهرباء	الكمية kWh	وقت التشغيل	التكلفة (جنيه مصري)	
النوع				
كهرباء عامة				
اخرى				
المساحات المتاحة				
المساحة م ²	أسقف خرسانية	أسقف جمالون	أرض فضاء	
الإجمالي م ²				
الممارسات	نعم	لا	ملاحظات	
هل هناك اجراءات لترشيد إستهلاك الطاقة في عملية الإنتاج				
هل قامت الشركة بدراسات في مجال ترشيد الطاقة				
هل يوجد بالشركة قسم لإدارة الطاقة				
